gantter™

Project Name **P7_05_planningProjet**
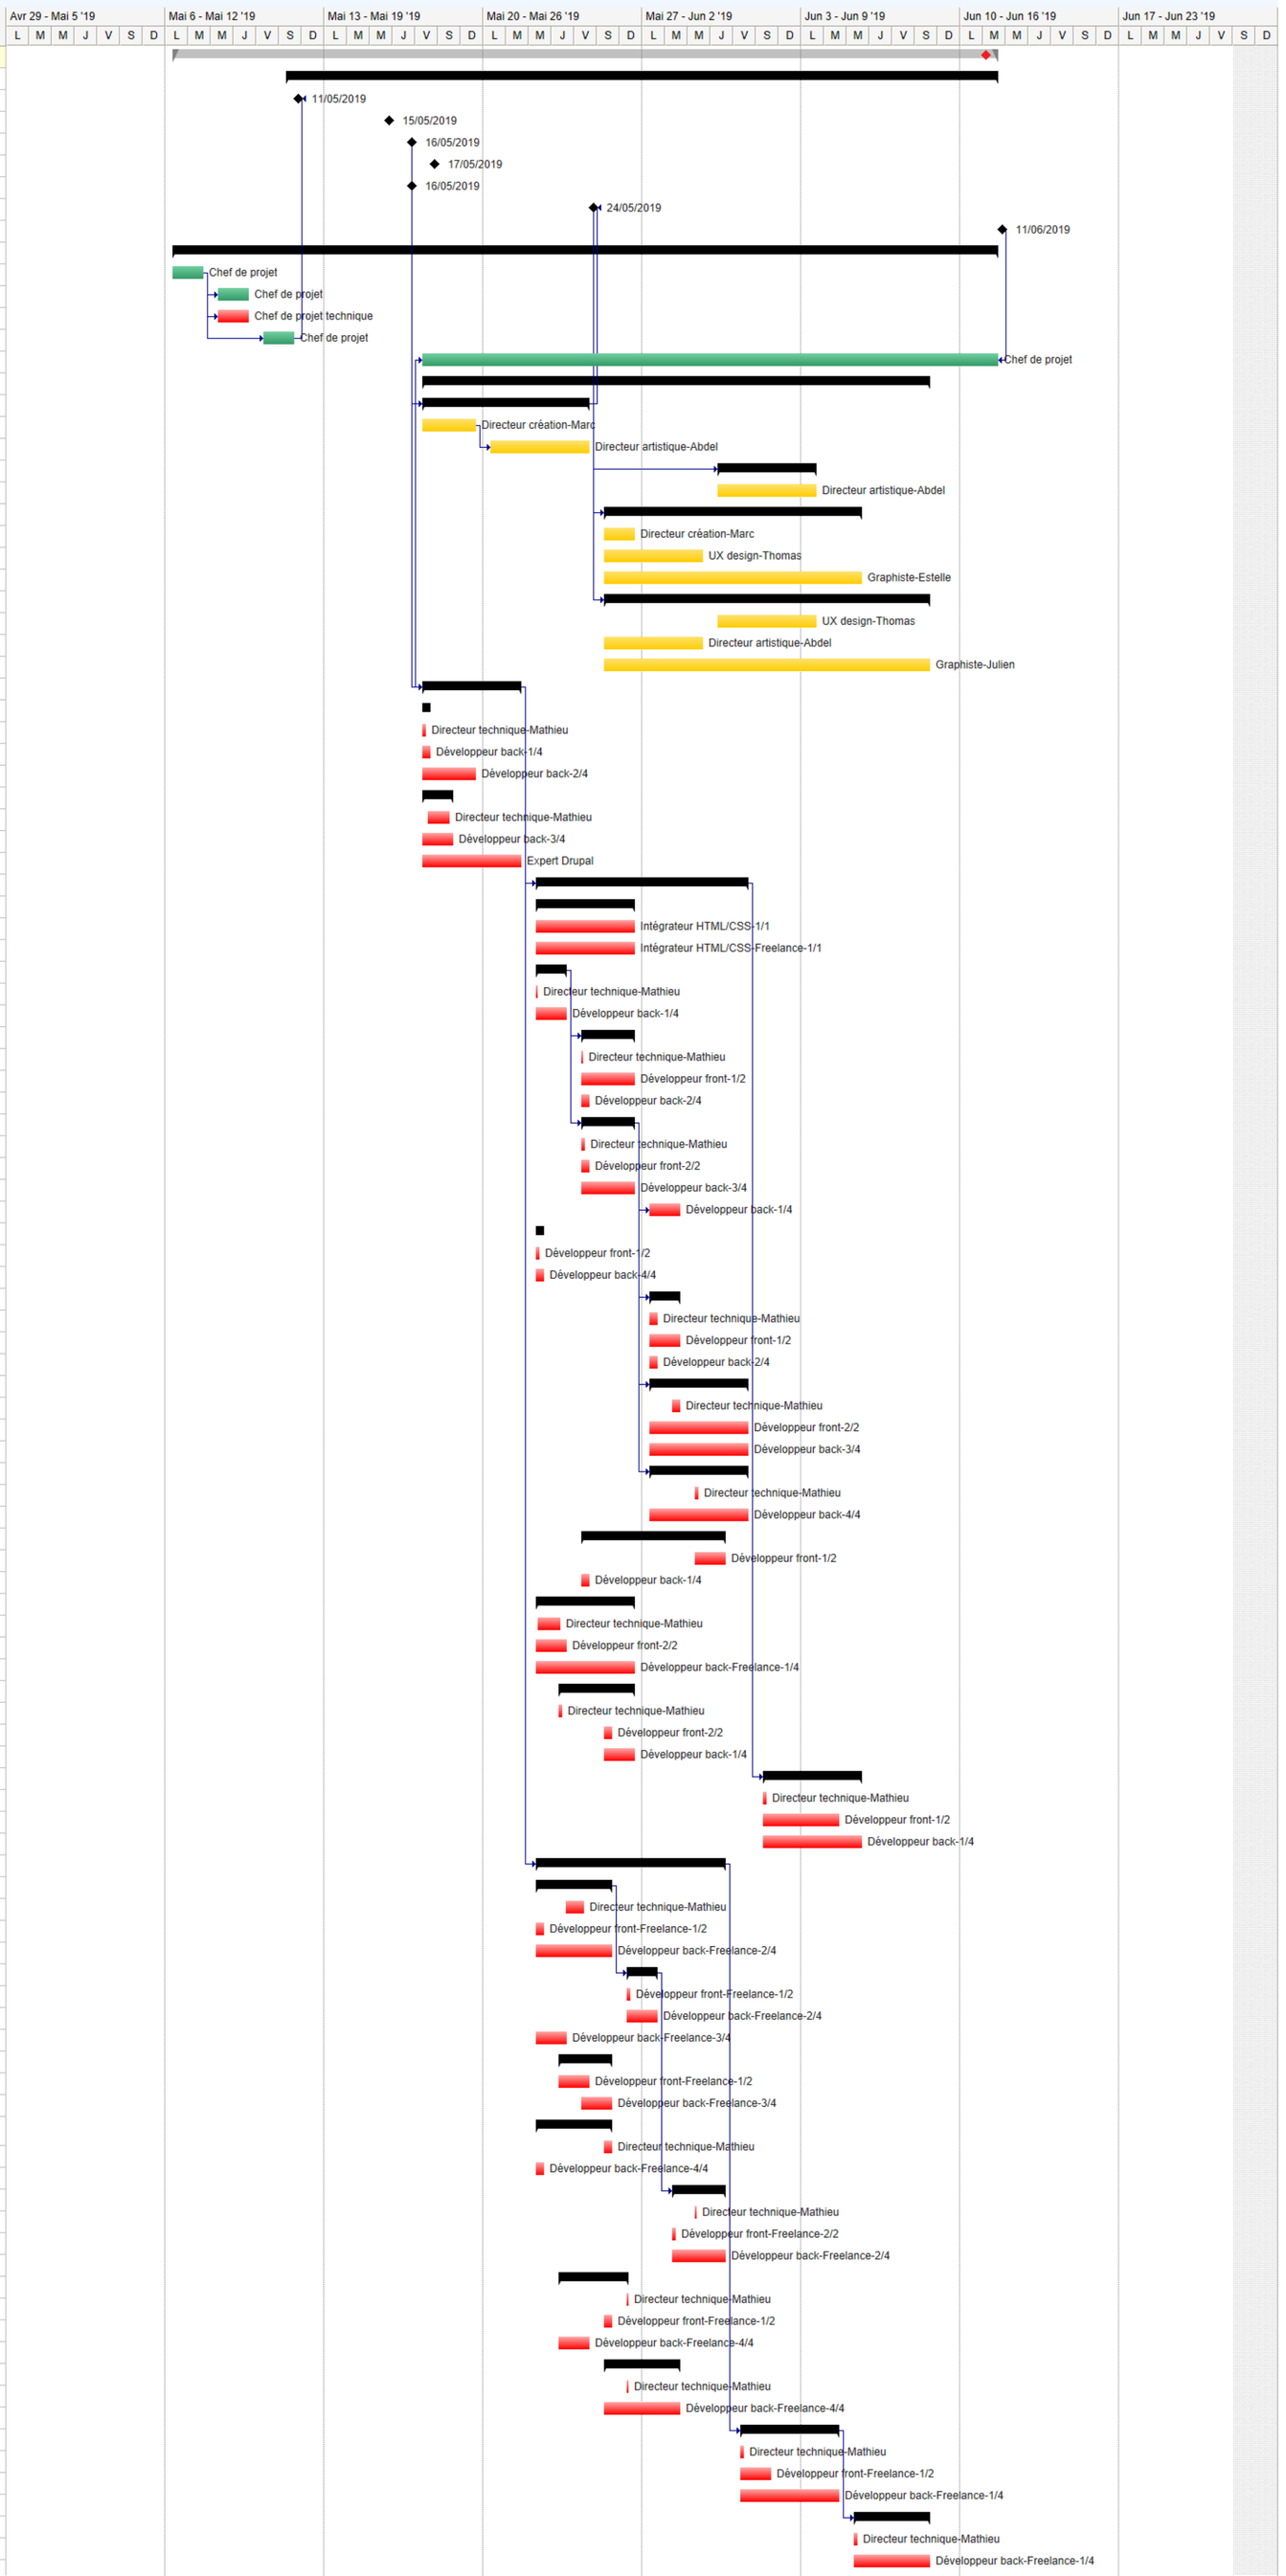
		Nom	Durée	Coût	Début	Fin	Prédécesse	Ressources
0		**P7_05_planningProjet**	**37journées?**	**137812.72€**	**06/05/2019**	**11/06/2019**		
1		**Échéances du projet**	**32journées**	**0€**	**11/05/2019**	**11/06/2019**		
2		Remise de l'offre	1journée	0€	11/05/2019	11/05/2019	13FF	
3		Soutenance des propositions pour les candidats en short-list	1journée	0€	15/05/2019	15/05/2019		
4		Annonce du candidat et kick off projet	1journée	0€	16/05/2019	16/05/2019		
5		Validation spécifications fonctionnelles	1journée	0€	17/05/2019	17/05/2019		
6		Validation créations - Logo	1journée	0€	16/05/2019	16/05/2019		
7		Transmettre infos pour le packaging	1journée	0€	24/05/2019	24/05/2019	16FF	
8		Livraison : Mise en ligne du Projet	1journée	0€	11/06/2019	11/06/2019		
9		**Analyse du besoin et cadrage du projet**	**37journées?**	**20100€**	**06/05/2019**	**11/06/2019**		
10		Définition du projet	2journées	600€	06/05/2019	07/05/2019		Chef de projet
11		Analyse des risques	2journées	1200€	08/05/2019	09/05/2019	10	Chef de projet
12		Spécifications techniques	2journées	1500€	08/05/2019	09/05/2019	10	Chef de projet technique
13		Spécifications fonctionnelles	2journées	1200€	10/05/2019	11/05/2019	10	Chef de projet
14		Suivi du projet	26journées?	15600€	17/05/2019	11/06/2019	8FF,29DD	Chef de projet
15		**Création**	**23journées?**	**35750€**	**17/05/2019**	**08/06/2019**		
16		**Identité de marque**	**8journées?**	**6350€**	**17/05/2019**	**24/05/2019**	**6**	
17		Identité de marque-Marc	3journées?	2850€	17/05/2019	19/05/2019		Directeur création-Marc
18		Identité de marque-DA	5journées?	3500€	20/05/2019	24/05/2019	17	Directeur artistique-Abdel
19		**Création packaging**	**5journées?**	**3500€**	**30/05/2019**	**03/06/2019**	**16,7**	
20		Création packaging-DA	5journées?	3500€	30/05/2019	03/06/2019		Directeur artistique-Abdel
21		**Création du site**	**12journées?**	**11400€**	**25/05/2019**	**05/06/2019**	**16**	
22		Création du site-Marc	2journées?	1900€	25/05/2019	26/05/2019		Directeur création-Marc
23		Création du site-UX	5journées?	3500€	25/05/2019	29/05/2019		UX design-Thomas
24		Création du site-Graphiste	12journées?	6000€	25/05/2019	05/06/2019		Graphiste-Estelle
25		**Création de l'appli**	**15journées?**	**14500€**	**25/05/2019**	**08/06/2019**	**16**	
26		Création de l'appli-UX	5journées?	3500€	30/05/2019	03/06/2019		UX design-Thomas
27		Création de l'appli-DA	5journées?	3500€	25/05/2019	29/05/2019		Directeur artistique-Abdel
28		Création de l'appli-Graphiste	15journées?	7500€	25/05/2019	08/06/2019		Graphiste-Julien
29		**A - Développement Général (Site web + App)**	**5journées?**	**9750.2€**	**17/05/2019**	**21/05/2019**	**4**	
30		**A1 - Setup de l'environnement de développement**	**1journée?**	**1025€**	**17/05/2019**	**17/05/2019**		
31		A1 - Setup de l'environnement de développement-DT	0.5journée?	425€	17/05/2019	17/05/2019		Directeur technique-Mathieu
32		A1 - Setup de l'environnement de développement-dev Back	1journée?	600€	17/05/2019	17/05/2019		Développeur back-1/4
33		A2 - Site + App Setup des bases données-dev Back	3journées?	1800€	17/05/2019	19/05/2019		Développeur back-2/4
34		**A3 - Site + App Lien comptes et données appli <> site (webservices ???)**	**2journées?**	**2050€**	**17/05/2019**	**18/05/2019**		
35		A3 - Site + App Lien comptes et données appli <> site-DT	1journée?	850€	17/05/2019	18/05/2019		Directeur technique-Mathieu
36		A3 - Site + App Lien comptes et données appli <> site-dev Back	2journées?	1200€	17/05/2019	18/05/2019		Développeur back-3/4
37		A4 - Architecture technique commune Web/Appli sur Drupal	5journées?	4875.2€	17/05/2019	21/05/2019		Expert Drupal
38		**B - Fonctionnalités propres au site web**	**10journées?**	**36200€**	**22/05/2019**	**31/05/2019**	**29**	
39		**B1 - Intégration (base : 5 gabarits)**	**5journées?**	**5175€**	**22/05/2019**	**26/05/2019**		
40		B1 - Intégration (base : 5 gabarits) - diviser tache en 2	5journées?	2250€	22/05/2019	26/05/2019		Intégrateur HTML/CSS-1/1
41		B1 - Intégration (base : 5 gabarits) - diviser tache en 2	5journées?	2925€	22/05/2019	26/05/2019		Intégrateur HTML/CSS-Freelance-1/1
42		**B2 - Setup CMS (base : Drupal)**	**2journées?**	**1412.5€**	**22/05/2019**	**23/05/2019**		
43		B2 - Setup CMS (base : Drupal)-DT	0.25journée?	212.5€	22/05/2019	22/05/2019		Directeur technique-Mathieu
44		B2 - Setup CMS (base : Drupal)-dev Back	2journées?	1200€	22/05/2019	23/05/2019		Développeur back-1/4
45		**B3 - Création thème CMS**	**3journées?**	**2462.5€**	**24/05/2019**	**26/05/2019**	**42**	
46		B3 - Création thème CMS-DT	0.25journée?	212.5€	24/05/2019	24/05/2019		Directeur technique-Mathieu
47		B3 - Création thème CMS-dev Front	3journées?	1650€	24/05/2019	26/05/2019		Développeur front-1/2
48		B3 - Création thème CMS-dev Back	1journée?	600€	24/05/2019	24/05/2019		Développeur back-2/4
49		**B4 - Création de compte / Identification**	**3journées?**	**2775€**	**24/05/2019**	**26/05/2019**	**42**	
50		B4 - Création de compte / Identification-DT	0.5journée?	425€	24/05/2019	24/05/2019		Directeur technique-Mathieu
51		B4 - Création de compte / Identification-dev Front	1journée?	550€	24/05/2019	24/05/2019		Développeur front-2/2
52		B4 - Création de compte / Identification-dev Back	3journées?	1800€	24/05/2019	26/05/2019		Développeur back-3/4
53		B5 - Compte utilisateur (consultation, modification)	2journées?	1200€	27/05/2019	28/05/2019	49	Développeur back-1/4
54		**B6 - Gestion des rappels par email**	**1journée?**	**875€**	**22/05/2019**	**22/05/2019**		
55		B6 - Gestion des rappels par email-dev Front	0.5journée?	275€	22/05/2019	22/05/2019		Développeur front-1/2
56		B6 - Gestion des rappels par email-dev Back	1journée?	600€	22/05/2019	22/05/2019		Développeur back-4/4
57		**B7 - Formatage des données utilisateur et export par email**	**2journées?**	**2550€**	**27/05/2019**	**28/05/2019**	**49**	
58		B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-DT	1journée?	850€	27/05/2019	27/05/2019		Directeur technique-Mathieu
59		B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-dev Front	2journées?	1100€	27/05/2019	28/05/2019		Développeur front-1/2
60		B7 - Formatage des données utilisateur et export par email-dev Back	1journée?	600€	27/05/2019	27/05/2019		Développeur back-2/4
61		**B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)**	**5journées?**	**6600€**	**27/05/2019**	**31/05/2019**	**49**	
62		B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-DT	1journée?	850€	28/05/2019	28/05/2019		Directeur technique-Mathieu
63		B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-dev Front	5journées?	2750€	27/05/2019	31/05/2019		Développeur front-2/2
64		B8 - Environnement dashboard utilisateur (avec data visualisation)-dev Back	5journées?	3000€	27/05/2019	31/05/2019		Développeur back-3/4
65		**B9 - Adaptation Back Office pour exportation des données utilisateur**	**5journées?**	**3425€**	**27/05/2019**	**31/05/2019**	**49**	
66		B9 - Adaptation Back Office pour exportation des données utilisateur-DT	0.5journée?	425€	29/05/2019	29/05/2019		Directeur technique-Mathieu
67		B9 - Adaptation Back Office pour exportation des données utilisateur-dev Back	5journées	3000€	27/05/2019	31/05/2019		Développeur back-4/4
68		**B10 - Gestion des mails transactionnels (base : 5 types de messages)**	**7journées**	**1700€**	**24/05/2019**	**30/05/2019**		
69		B10 - Gestion des mails transactionnels-dev Front	2journées	1100€	29/05/2019	30/05/2019		Développeur front-1/2
70		B10 - Gestion des mails transactionnels-dev Back	1journée	600€	24/05/2019	24/05/2019		Développeur back-1/4
71		**B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile**	**5journées?**	**5850€**	**22/05/2019**	**26/05/2019**		
72		B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-DT	1journée?	850€	22/05/2019	23/05/2019		Directeur technique-Mathieu
73		B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-dev Front	2journées	1100€	22/05/2019	23/05/2019		Développeur front-2/2
74		B11 - Adaptation Back Office pour gestion des contenus de l'application mobile-dev Back	5journées	3900€	22/05/2019	26/05/2019		Développeur back-Freelance-1/4
75		**B12 - Store locator (intégration d'une solution tierce, à définir)**	**4journées?**	**2175€**	**23/05/2019**	**26/05/2019**		
76		B12 - Store locator-DT	0.5journée?	425€	23/05/2019	23/05/2019		Directeur technique-Mathieu
77		B12 - Store locator-dev Front	1journée?	550€	25/05/2019	25/05/2019		Développeur front-2/2
78		B12 - Store locator-dev Back	2journées	1200€	25/05/2019	26/05/2019		Développeur back-1/4
79		**B13 - Tests / Traitement des retours de recette**	**5journées?**	**5625€**	**01/06/2019**	**05/06/2019**	**38**	
80		B13 - Tests / Traitement des retours de recette-DT	0.5journée?	425€	01/06/2019	01/06/2019		Directeur technique-Mathieu
81		B13 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Front	4journées	2200€	01/06/2019	04/06/2019		Développeur front-1/2
82		B13 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Back	5journées	3000€	01/06/2019	05/06/2019		Développeur back-1/4
83		**C- Fonctionnalités propres à l'Application Mobile**	**9journées?**	**21087.52€**	**22/05/2019**	**30/05/2019**	**29**	
84		**C1 - Création de compte / Identification**	**4journées?**	**4260€**	**22/05/2019**	**25/05/2019**		
85		C1 - Création de compte / Identification-DT	0.5journée?	425€	23/05/2019	24/05/2019		Directeur technique-Mathieu
86		C1 - Création de compte / Identification-dev front	1journée?	715€	22/05/2019	22/05/2019		Développeur front-Freelance-1/2
87		C1 - Création de compte / Identification-dev Back	4journées	3120€	22/05/2019	25/05/2019		Développeur back-Freelance-2/4
88		**C2 - Compte utilisateur (consultation, modification)**	**2journées?**	**1917.5€**	**26/05/2019**	**27/05/2019**	**84**	
89		C2 - Compte utilisateur-dev Front	0.5journée?	357.5€	26/05/2019	26/05/2019		Développeur front-Freelance-1/2
90		C2 - Compte utilisateur-dev Back	2journées	1560€	26/05/2019	27/05/2019		Développeur back-Freelance-2/4
91		C3 - Gestion des notifications (alertes, rappels, etc.)	2journées?	1560€	22/05/2019	23/05/2019		Développeur back-Freelance-3/4
92		**C4 - Extraction, formatage et transmission des données (mail via smartphone)**	**3journées**	**2990€**	**23/05/2019**	**25/05/2019**		
93		C4 - Extraction, formatage et transmission des données-dev Front	2journées	1430€	23/05/2019	24/05/2019		Développeur front-Freelance-1/2
94		C4 - Extraction, formatage et transmission des données-dev Back	2journées	1560€	24/05/2019	25/05/2019		Développeur back-Freelance-3/4
95		**C5 - Collecte et adaptation des données d'activité (via Santé et Google Fit uniquement)**	**4journées?**	**1630€**	**22/05/2019**	**25/05/2019**		
96		C5 - Collecte et adaptation des données d'activité-DT	1journée?	850€	25/05/2019	25/05/2019		Directeur technique-Mathieu
97		C5 - Collecte et adaptation des données d'activité-dev Back	1journée?	780€	22/05/2019	22/05/2019		Développeur back-Freelance-4/4
98		**C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur**	**3journées?**	**2910.02€**	**28/05/2019**	**30/05/2019**	**88**	
99		C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-DT	0.25journée?	212.5€	29/05/2019	29/05/2019		Directeur technique-Mathieu
100		C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-dev Front	0.5journée?	357.52€	28/05/2019	28/05/2019		Développeur front-Freelance-2/2
101		C6 - Gestion des informations de suivi entrées par l'utilisateur-dev Back	3journées?	2340€	28/05/2019	30/05/2019		Développeur back-Freelance-2/4
102		**C7 - Intégration des informations produits (lien avec CMS Web)**	**3.25journées**	**2487.5€**	**23/05/2019**	**26/05/2019**		
103		C7 - Intégration des informations produits-DT	0.25journée?	212.5€	26/05/2019	26/05/2019		Directeur technique-Mathieu
104		C7 - Intégration des informations produits-dev Front	1journée?	715€	25/05/2019	25/05/2019		Développeur front-Freelance-1/2
105		C7 - Intégration des informations produits-dev Back	2journées?	1560€	23/05/2019	24/05/2019		Développeur back-Freelance-4/4
106		**C8 - Compilations et exportations pour les deux types d'app iOS et Android**	**4journées?**	**3332.5€**	**25/05/2019**	**28/05/2019**		
107		C8 - Compilations et exportations pour les deux types d'app iOS et Android-DT	0.25journée?	212.5€	26/05/2019	26/05/2019		Directeur technique-Mathieu
108		C8 - Compilations et exportations pour les deux types d'app iOS et Android-dev Back	4journées	3120€	25/05/2019	28/05/2019		Développeur back-Freelance-4/4
109		**C9 - Tests / Traitement des retours de recette**	**5journées?**	**5755€**	**31/05/2019**	**04/06/2019**	**83**	
110		C9 - Tests / Traitement des retours de recette-DT	0.5journée?	425€	31/05/2019	31/05/2019		Directeur technique-Mathieu
111		C9 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Front	2journées?	1430€	31/05/2019	01/06/2019		Développeur front-Freelance-1/2
112		C9 - Tests / Traitement des retours de recette-dev Back	5journées?	3900€	31/05/2019	04/06/2019		Développeur back-Freelance-1/4
113		**C10 - Gestion de la publication sur les stores**	**4journées?**	**3545€**	**05/06/2019**	**08/06/2019**	**109**	
114		C10 - Gestion de la publication sur les stores-DT	0.5journée?	425€	05/06/2019	05/06/2019		Directeur technique-Mathieu
115		C10 - Gestion de la publication sur les stores-dev Back	4journées	3120€	05/06/2019	08/06/2019		Développeur back-Freelance-1/4
